

mars 2018



REALISATIONS 2012-2017

ISSUES DES ATELIERS

DU PARC NATUREL URBAIN ILL BRUCHE

DE STRASBOURG

7 fiches Bilan Ateliers

- 1- Découverte du PNU
- 2- PNU et PLU
- 3- Aménagement Saint-Gall
- 4- Aménagement Emmaüs Holtzmann
- 5- Tour et jardin du Schloessel
- 6- Les folies végétales du Muhlbach
- 7- Animation –Fête du PNU

RÉDACTION : LÉA KINE - BÉATRICE PIPART

MISSION PNU - DIRECTION URBANISME ET TERRITOIRES

VILLE ET EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG

Démarrage en avril 2012

OBJECTIFS

Faire découvrir le territoire du PNU et valoriser son patrimoine naturel et urbain.

Faire émerger une nouvelle dynamique culturelle dans les quartiers de Koenigshoffen, Montagne Verte et Elsau, à partir de leur patrimoine et de leur capital associatif.

BUDGET

moins de 100 k€ de 2012 à 2016, Ville de Strasbourg



DESCRIPTION DU PROJET

CONTEXTE

Le site du PNU III Bruche a un fort potentiel patrimonial, historique, écologique. Ce sont des espaces encore peu fréquentés et peu connus à la fois des strasbourgeois et des habitants de ces quartiers par manque de visibilité et d'information.

PARTENAIRES

Club Vosgien, Fédération française de randonnée pédestre, habitants, historiens, Foyer St Arbogast, Centres Socio-Culturels Elsau, Koenigshoffen, et Montagne Verte, Koenigshoffen Demain, AREL, Piétons 67, Services de la Ville (Communication, Menuiserie (panneaux), Propreté urbaine, Culture, DUT), Agence VO

DEROULEMENT

- 4 séances (1 visite de terrain et 3 réunions en salle) d'avril à juin 2012 pour définir le projet de signalétique ;
- Plusieurs séances de balisage des sentiers pédestres du PNU avec le Club Vosgien

RESULTATS

- 7 parcours balisés par des stickers ;
- 14 panneaux d'accueil posés principalement en périphérie, conçus et réalisés par les services de la Ville ;
- Conception et diffusion d'une plaquette de découverte du PNU : 2 éditions début 2015, début 2016, 2 x 6 000 ex. ;
- Animation des parcours lors de « PNU en fête », ou à certaines Journées Européennes du Patrimoine ;
- Visites du PNU à la demande (Etudiants, chercheurs...).

FREINS OBSERVES

- Vandalisme sur certains panneaux et sur le balisage ;
- Besoin d'une veille, d'entretien et de renouvellement,
- Pas encore de prise en charge par un service technique ;
- Pas de charte adaptée de balisage piéton nature à la Ville ;
- Faible coordination interservice

PARTIE EVALUATIVE

BILAN

- Bilan très positif des outils de découverte des quartiers et de ses richesses patrimoniales ;
- Plaquettes de découverte du PNU diffusées de plus en plus largement, par l'Office du Tourisme, la Boutique culture, le Club Vosgien ... ;
- Certains panneaux sont plus lus que d'autres ;
- Entretien des panneaux non organisé (tags, casse), prestations du service propreté utilisées ponctuellement (tags) ;
- Pas de plaintes des usagers sur la qualité du balisage ;
- Le partenariat entre la Mission PNU et le Club Vosgien n'a pas été conclu par la convention de partenariat prévue ;
- Les partenaires sont engagés sur « PNU en fête » et les Journées Européennes du Patrimoine... notamment grâce à la forte dynamique de l'Atelier Animation Patrimoine.

ENSEIGNEMENTS

- Axe très fort et prioritaire du PNU qui a un réel impact positif sur l'image de ces quartiers
- Des demandes de visites régulières, un potentiel touristique non encore exploité
- Une organisation technique à renforcer pour perdurer


QUE RETENIR POUR LA PROCHAINE CHARTE ?

- Mettre au clair le mode d'entretien des panneaux par les services techniques, avec le soutien de la Direction de territoire et d'acteurs du PNU (parrainage de panneaux...)
- Engager un travail éducatif sur la découverte du territoire et l'écocitoyenneté (nettoyages citoyens)
- Mettre à jour la signalétique et la plaquette de découverte
- Contractualiser avec le Club Vosgien et développer ce partenariat
- Continuer à développer et diversifier les modes de découverte du territoire (nautisme, poneys...),
- Développer des activités de guide et des visites plus régulières

Balisage — Panneaux d'accueil — Visites



Démarrage Nov. 2012

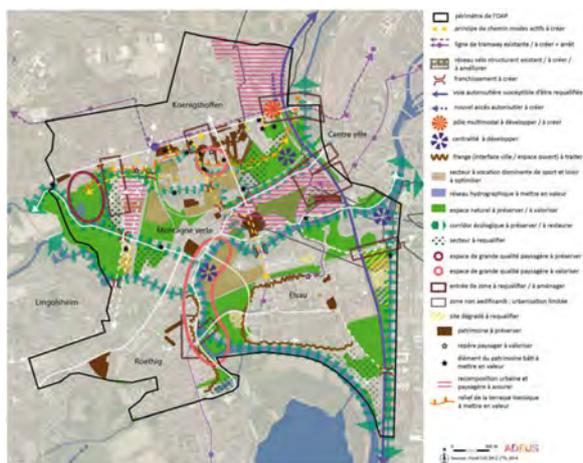**OBJECTIFS**

- Inscrire le PNU dans le Plan Local d'urbanisme pour le pérenniser, sous la forme d'une Orientation d'Aménagement et de Programmation — OAP
- Expérimenter l'écriture de cette OAP en mode participatif

BUDGET : intégré au partenariat annuel EMS – ADEUS**DESCRIPTION DU PROJET****CONTEXTE**

- Plan Local d'Urbanisme en préparation ;
- Volonté politique de valoriser la trame verte et bleue, le patrimoine architectural et urbain, une meilleure accessibilité à l'armature verte de la ville, développer le rayonnement socio-économique, rapprocher les quartiers via le PNU ;
- Recours juridiques sur la Modification 33 du POS ;

PARTENAIRES

- Association PNU, AREL, habitants
- ADEUS, Services de la Ville (Prospective Planification territoriale, Projets urbains, Dir. Territoire, Déplacements)

DEROULEMENT

1. 3 séances d'atelier PNU et PLU à partir de novembre 2012
2. Puis travail entre les services et l'ADEUS
3. Un atelier « L'urbain dans le PNU » s'est réuni 2 fois

RESULTATS

Une liste de principes d'aménagement ont été inscrits au PLU de décembre 2016 :

- Préserver les espaces naturels à forte biodiversité, mettre en réseau les corridors écologiques, développer et veiller au bon fonctionnement de la gestion de l'eau ;
- Révéler et valoriser l'identité paysagère des quartiers du PNU III Bruche, renforcer le lien entre nature et ville, révéler le patrimoine bâti, assurer la qualité des espaces publics et de l'architecture, renforcer les fonctions récréatives ;
- Privilégier les déplacements actifs, faciliter l'accessibilité au PNU III Bruche, assurer un travail d'accroche avec les quartiers limitrophes ;
- Développer une mixité du tissu urbain, maintenir les activités agricoles diversifiées.

FREINS OBSERVES

- Faible participation (4 pers. max à l'atelier PNU et PLU)
- Difficulté à appréhender le PLU pour la plupart des acteurs ;
- Arrêt de l'animation de l'atelier « l'urbain dans le PNU » pourtant plus attractif (15 pers.), par manque de moyens et méthode, et lié au démarrage de projets plus opérationnels.

PARTIE EVALUATIVE**BILAN**

- Réelle motivation des services, de l'Adeus et des participants qui a permis une avancée expérimentale ;
- Le concept de centralité verte innove ;
- A l'usage, l'OAP et le PLU ne sont pas toujours assez adaptés ou prescriptifs pour suivre l'intérêt général ;
- Nécessite une réflexion transversale à long terme par les services et les élus, pour faire émerger une vision partagée du territoire ;
- Certains enjeux n'ont pas été intégrés à l'OAP PNU car ils sont apparus plus tard : l'importance du caractère économique du parc Gruber, le besoin d'une nouvelle école à Koenigshoffen, le renouvellement urbain de l'Elsau, de la cité Westoffen ;
- L'OAP PNU a précédé d'autres OAP sur la Trame Verte et Bleue, Porte des Romains, des mises à jour sont à effectuer.


ENSEIGNEMENTS

- Difficulté à mobiliser des habitants et acteurs sur ce thème prospectif et réglementaire assez technique ;
- Les services techniques ont besoin d'être éclairés par les habitants sur leur désir d'évolution de leur quartier, en dépassant les blocages liés au syndrome du NIMBY ;
- Nécessité d'un travail transversal entre services et élus, articulé avec les acteurs du quartier par une méthode pédagogique à mettre au point, sur la question de l'évolution de l'urbanisation.

QUE RETENIR POUR LA PROCHAINE CHARTE ?

- Mettre au point une méthode de travail adéquate qui permette de mieux mobiliser et intéresser les acteurs dans la durée sur la question de l'évolution de l'urbanisation
- Renouveler cette OAP, au vu de l'évolution des enjeux : nouvelle école, Gruber, renouvellement urbain et écoquartier de l'Elsau,...
- Concept de centralité verte, ou de label PNU à développer.

Carte d'orientations du PNU inscrite au PLU

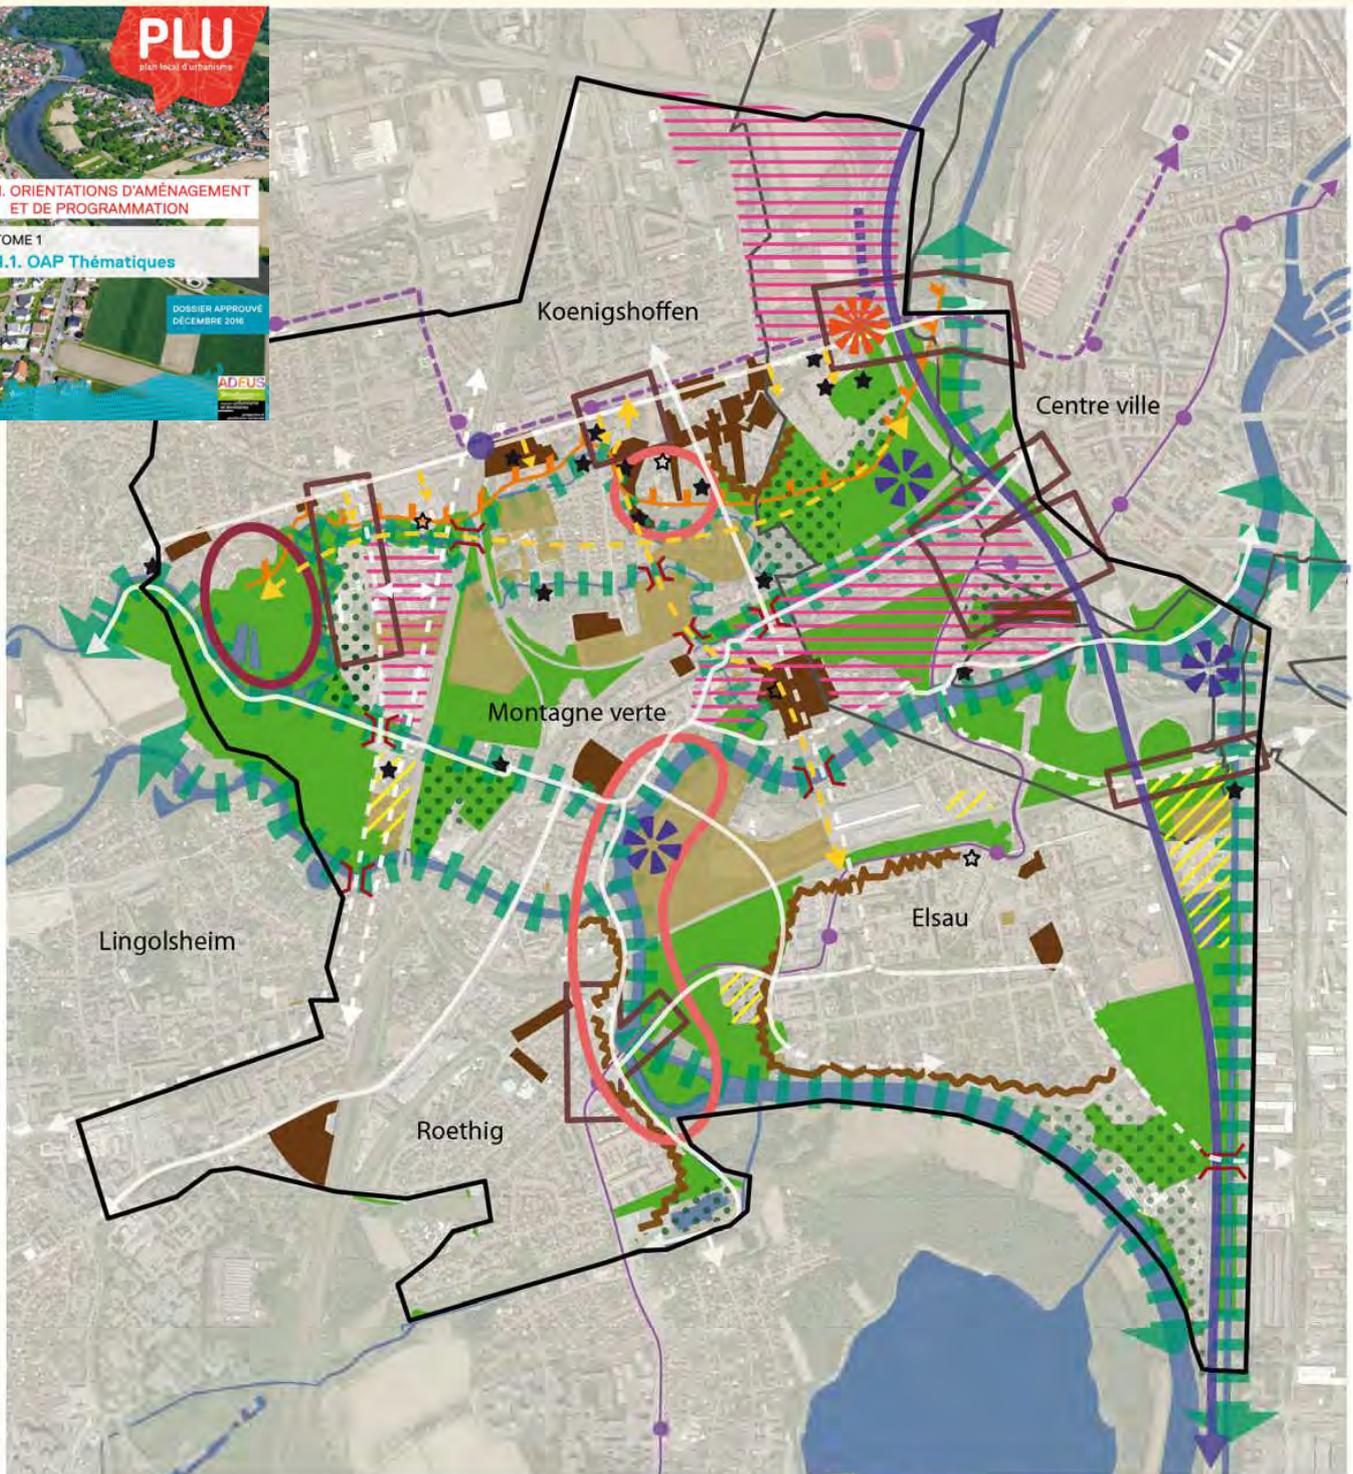

- | | | |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| périmètre de l'OAP | secteur à vocation dominante de sport et loisir à optimiser | patrimoine à préserver |
| principe de chemin modes actifs à créer | réseau hydrographique à mettre en valeur | repère paysager à valoriser |
| ligne de tramway existante / à créer + arrêt | espace naturel à préserver / à valoriser | élément du patrimoine bâti à mettre en valeur |
| réseau vélo structurant existant / à créer / à améliorer | corridor écologique à préserver / à restaurer | recomposition urbaine et paysagère à assurer |
| franchissement à créer | secteur à requalifier | relief de la terrasse loessique à mettre en valeur |
| voie autoroutière susceptible d'être requalifiée | espace de grande qualité paysagère à préserver | |
| nouvel accès autoroutier à créer | espace de grande qualité paysagère à valoriser | |
| pôle multimodal à développer / à créer | entrée de zone à requalifier / à aménager | |
| centralité à développer | zone non aedificandi : urbanisation limitée | |
| frange (interface ville / espace ouvert) à traiter | site dégradé à requalifier | |

Démarrage Oct. 2012

OBJECTIFS

- Co-construire avec les parties prenantes un projet d'aménagement du secteur St Gall à partir des orientations du Livre Blanc.

- Valoriser une entrée du PNU, le Parc potager Saint Gall.

BUDGET 890 000 € TTC de 2012 à 2017

560 000 € Ville, 330 000 € Eurométropole de Strasbourg

**DESCRIPTION DE L'ATELIER****CONTEXTE**

Site majoritairement propriété de la Ville, avec 200 jardins familiaux, la culture de maïs (3ha) a été arrêtée faute d'alternative PNU compatible, c'est devenu un espace public..

PARTENAIRES

Habitants, riverains et jardiniers.

Brin de Paille, Eco Conseil, Maison du Compost, Jardins de la Montagne Verte, Germes d'Espoir, Ecole Michaël, Parenchancement, Club jardin et compostage

DEROULEMENT

1. 4 séances de concertation (1/mois) ont conduit au plan guide du Parc potager St Gall mi 2013
2. Séances régulières de suivi-modification des projets
3. Séance de bilan après les dernières réalisations de 2016, en février 2017 pour le suivi de la vie du site.

RESULTATS

- Un plan guide du secteur co-construit (annexe)
- Naissance du parc potager Saint-Gall
- Travaux progressifs depuis 2012

FREINS OBSERVES

- Camps de Roms sur le site : tensions avec les riverains ;
- Opposition des riverains : abandon du projet de parking rue des meules, et modifications d'emplacement et d'accès aux jardins partagés ;
- Pollutions de sols et eaux découvertes en 2014 : surveillance de la qualité des végétaux sur Brin de paille, programme de dépollution de la nappe en préparation ;
- Modification de gestion : nouvelles surfaces à gérer pour le S. Espaces verts (4ha), difficulté à supprimer des clôtures par crainte de dépôts de déchets.

PARTIE EVALUATIVE**BILAN**

- Site plus vivant grâce à l'ajout d'une dynamique collective plus jeune : 5 jardins partagés dont 4 regroupés, nouveaux espaces publics et contrôles d'accès valorisants ;
- Satisfaction des riverains s'est manifestée en 2016 : désir de signer la charte du PNU et meilleure collaboration ;
- Les chemins de chèvre sont très pratiqués, mais l'accès au public du Parc potager par la rue des meules n'est pas encore acquis ;
- Des aménagements non finalisés (dernier projet de maillage du territoire non mené suite à la découverte de la pollution de la nappe, belvédère non valorisé, agrandissement de la déchetterie), il existe donc des possibilités de poursuite ;
- Mise en œuvre très progressive de la gestion du site (nouvelles surfaces à gérer pour le SEVN, sécurisation du bois, fauchage, nettoyage) ;
- Abandon (temporaire ?) du projet de jardins familiaux au Sud de Brin de Paille, en raison de sols non compatibles.

ENSEIGNEMENTS

Attention à bien inclure les riverains dès le début du projet, particulièrement dans les zones de frange urbaine.

L'approche rustique fonctionne

Belle dynamique des jardins partagés, gros défis

Suivre la gestion des déchets : équilibre entre l'équipement en poubelles et l'éducation au geste responsable

QUE RETENIR POUR LA PROCHAINE CHARTE ?

- Mailler le site (accès camping) et poursuivre sa valorisation
- Continuer la surveillance de la qualité des végétaux et la dépollution de la nappe phréatique
- Accompagner le cimetière juif de Saint Gall dans une gestion « 0 pesticide » pour diminuer la pollution
- Mieux gérer les déchets et l'entretien —communiquer

Après



Avant





Strasbourg / Montagne-Verte / PNU
Plan guide du secteur Holtzmatt - synthèse des orientations à moyen et long terme
CUS/DUAH/Projets Urbains/mal 2014

Démarrage en 2012

OBJECTIFS

- Rendre accueillante l'entrée de ce site entre la Bruche et la liaison cyclable du Canal de la Bruche (accès Molsheim)
- Pérenniser l'activité de recyclerie d'Emmaüs
- Valoriser ce site et le lien piédestre entre la Montagne verte et Eckbolsheim

BUDGET 391 000 € de 2012 à 2017

163 000 € Ville, et 228k€ Eurométropole

DESCRIPTION DU PROJET

CONTEXTE

- Demande d'Emmaüs d'un accompagnement cohérent de la collectivité pour la consolidation de l'activité de recyclerie, voirie exigüe et parking insuffisant ;
- Site inondable peu qualifié mais à fort potentiel pour décharger la piste du Canal surfréquentée.

PARTENAIRES

Communauté Emmaüs, CD67, jardiniers, AJOSO, ASES Tir et Tennis, Electricité de Strasbourg, commune d'Eckbolsheim-Haies Vives d'Alsace, RFF, JMV, agriculteurs, DMEPN, DESPU

DEROULEMENT

1. Chantier concerté avec Emmaüs dès 2012 : voirie, parking, clôture, assise juridique pour le développement de la recyclerie dans une perspective de valorisation du site, inauguré en février 2013 ;
2. 4 séances d'Atelier dès mars 2013 débouchent sur un plan guide : espaces verts, verger, jardins, traitement des limites, barrières, contrôle d'accès, voirie, stationnement, liaisons cyclables et piétonnes, secteur d'ES ;
3. Mise en œuvre du Plan guide : Transmission mi 2014 à la DMEPN d'un cahier des prescriptions.

RESULTATS

- Création du point d'accueil Emmaüs - Abbé Pierre du PNU ;
- Réalisation d'un parking vert, paysager, rustique de 100 places ;
- Valorisation de l'entrée de la Holtzmatt avec rénovation de la voirie et de l'éclairage public ;
- Rencontres entre acteurs du site et modification des barrières d'accès rendant moins fréquent les dépôts de déchets.

FREINS OBSERVES

- Prise en main tardive du dossier à la DMEPN, mise en œuvre de la phase 3 retardée
- Foncier réparti entre RFF, ES, Gaz, CD67, un terrain privé en berge, zone naturelle, grevée d'un emplacement réservé...

PARTIE EVALUATIVE

BILAN

- Une entrée de site plus valorisé et sécurisée pour la circulation automobile, piétonne et cycliste, un parking esthétique, en accord avec les espaces naturels autour ;
- Ce parking a été agrandi en 2017 par la communauté Emmaüs sur leurs propres espaces verts car la fréquentation est plus intense que ce qui avait été prévu ;

- Chantier de clôture végétale mené par Haies Vives d'Alsace pour Emmaüs qui lui a permis d'acquérir une expérience ;

Le nouveau bail emphytéotique d'Emmaüs leur donne une vision du devenir du site et permet un déploiement d'activités nourricières formatrices pour les compagnons ;

Le plan guide du site pensé par l'atelier n'a pas encore abouti sur la réalisation des projets au delà de l'entrée

ENSEIGNEMENTS

- Projet à revoir dans son organisation interne pour pouvoir mener la coordination d'acteurs en adéquation avec les moyens humains disponibles ;
- Le plan guide est oublié par certains acteurs qui fonctionnent de manière isolée en oubliant les autres usages que le leur ou en négligeant la qualité paysagère du site ce qui tend à disqualifier les progrès obtenus (Contrôle d'accès à l'entrée du lotissement de jardins de la Holtzmatt de l'AJOSO)

QUE RETENIR POUR LA PROCHAINE CHARTE ?

- Faire connaître cet exemple de parking « PNU compatible »
- La dynamique partenariale est à relancer de manière adaptée aux possibles
- Revoir les priorités du projet pour inclure la liaison avec Eckbolsheim attendue par cette commune
- Nécessité d'un pilotage interne plus solide et adapté

Après



Avant





DESCRIPTION DU PROJET

CONTEXTE

- La Tour du Schloessel, monument historique de 6 siècles d'histoire, a été sauvée de la démolition en 1985 sans toutefois trouver sa vocation et son lien aux quartiers ;
- 4 niveaux dans la tour, servent de logement, il reste 434 m² sur 3 niveaux destinés à une Maison du PNU depuis 2011;
- La réhabilitation du bâtiment, lancée par la Ville en novembre 2013 vise l'ouverture au public du RdC et l'usage de bureaux aux étages, dans la dynamique du PNU.

PARTENAIRES

CEEAC, Haies Vives d'Alsace, EHPAD Emmaüs-Diaconesses Koenigshoffen, habitants, CSC Camile Claus, Koenigshoffen Demain, SINE de Bussière, locataire, Conseil de quartier, Habitation moderne, Services de la Ville

DEROULEMENT

1. 3 séances d'atelier « Maison du PNU à la Tour du Schloessel » dès avril 2012, et la dernière en février 2016.
2. 2 séances d'atelier pour choisir l'artiste et l'oeuvre pour une gloriette face à la Tour du Schloessel
3. Travaux progressifs et Inaugurations des différentes phases : Passerelle (2013), Jardin et gloriette (2014), Journées du patrimoine en 2016, PNU en fête...
4. Premier Comité de gestion en septembre 2017

RESULTATS

- L'abri de rouille de Pierre Gauchet : sculpture en corten ;
- Restauration et désenclavement du jardin : passerelle piétonne, mise en valeur des berges, clôture végétale, pavage aléatoire, assises diverses, clôture végétale et plantations selon le guide « Plantons local » ;
- Réhabilitation du bâtiment ;
- Exposition, édition d'un « Carnet de ville » et animations sur l'histoire de la Tour aux Journées du Patrimoine de 2016 ;
- Premières mises à disposition aux « chartés PNU » en 2017.

Démarrage en avril 2012

OBJECTIFS

- Faire de la Tour du Schloessel la Maison du PNU et ouvrir au public son jardin et le rez-de-chaussée du bâtiment ;
- Mettre aux normes le bâtiment ;
- Restaurer et gérer les espaces extérieurs ;
- Définir un projet et un mode de gestion adapté.

BUDGET 2012 2017 : 855 k€ Ville de Strasbourg

Maitrise d'œuvre : Ville de Strasbourg / Meyzaud & architectes

PARTIE EVALUATIVE

BILAN

- Un lieu vivant : le jardin du schloessel est régulièrement utilisée par les riverains, des promeneurs, et des groupes ;
- La Tour du Schloessel commence à être identifiée comme cœur du PNU et projet exemplaire, phare du PNU ;
- L'accessibilité au site est à renforcer par une signalisation ;
- Plusieurs acteurs et partenaires différents utilisent déjà les lieux : habitants, artisans, artistes, associations, agents et élus de l'Eurométropole de Strasbourg ;
- Plusieurs associations mettent en œuvre des animations du lieu : un café associatif, les locataires des bureaux (Labo des partenariats) et d'autres souhaitent encore s'investir dans la vie de la Maison du PNU ;
- La facturation du chauffage contractualisée avec l'EHPAD est en cours de finalisation;
- Un Comité de gestion est à développer pour finaliser les règles de fonctionnement, coopérer entre acteurs, améliorer et maintenir l'esprit PNU du site.

ENSEIGNEMENTS

- Le lieu très attractif présente un fort potentiel ;
- La future gestion du lieu, comme Maison du PNU, reste un enjeu important à réussir.

QUE RETENIR POUR LA PROCHAINE CHARTE ?

- Mettre en place une signalétique pour faciliter l'accès ;
- Installer de nouveaux arceaux à vélo et investir le jardin ;
- Faire connaître ce lieu comme site phare du PNU, exemple d'expertise technique, paysagère, urbaine en matière de réhabilitation d'un jardin, d'un bâtiment, et d'animation ;
- S'appuyer sur ce lieu pour concevoir et dynamiser l'avenir du PNU : professionnels, café associatif, animations
- Mettre en place un mode de gestion collaboratif adapté

Après



Avant





DESCRIPTION DU PROJET

CONTEXTE

- Une prairie de 17 ares à proximité de la Route des Romains, proche d'une zone en mutation ;
- Une demande forte d'espaces de jeux pour enfants
- une opportunité pour un projet « PNU compatible »

PARTENAIRES

Haies Vives d'Alsace, environ 200 bénévoles dont le CSC Camille Clauss, l'école Mikael, Parenchancement, Koenigshoffen DFemain, et la crèche des chérubins

DEROULEMENT

1. Signature d'une convention d'occupation des lieux et d'une convention cadre de partenariat de 48 k€ sur 4 ans avec Haies Vives d'Alsace pour la conception, les chantiers, la maintenance, l'entretien du site
2. 15 journées de chantiers participatifs organisées entre novembre 2015 et mars 2017, conçues et co-réalisés par l'association Haies Vives d'Alsace,
3. 220 plants dont 50 fruitiers ont été plantés et 1000 brins de saule ont été tressés pour en faire des œuvres en bois.

RESULTATS

- Création d'une aire végétale : bancs et cabane en bois, plessis de châtaignier, ouvrage en osier
- Plantation d'arbustes destinées à être plessés, et d'une haie fruitière
- Gestion du site par l'association Haies Vives d'Alsace en lien avec le S. Espaces verts

FREINS OBSERVES

- La terre est pauvre, retient peu l'eau et comprend une bonne partie de remblais (pertes de plants)
- Peu de moyens au Service gestionnaire Espaces verts et de Nature , pour pérenniser le site

Démarrage en novembre 2015

OBJECTIFS

- Créer un espace ludique et démonstratif entièrement végétal
- Réaliser des chantiers participatifs pour apprendre à réaliser des clôtures et structures végétales favorables à la biodiversité.

BUDGET : 45 000 € de 2015 à 2017, Ville de Strasbourg (21 000 € en 2018 avec l'aire d'ébat pour chiens)

PARTIE EVALUATIVE

BILAN

- Un espace différent, fréquenté par les familles, les adultes et les propriétaires de chiens ;
- Aménagement clivant qui plait aux jeunes adultes et plait moins aux anciens (herbes folles) ;
- Un site peu connu, mais régulièrement visité par des groupes (CSC Camille Clauss ,...) ;
- Des panneaux d'information ont été posés par Haies Vives d'Alsace
- Problème de déchets sauvages et de vandalisme, mais appropriation par des personnes qui nettoient
- Questionnements sur la gestion future du site après 2018

ENSEIGNEMENTS

- Gros intérêt des chantiers participatifs pour dynamiser et mobiliser les acteurs et riverains d'un projet : une méthode à consolider, elle repose sur des subventions ...
- Ce site est l'occasion :
 - .de transmettre des messages sur la biodiversité en ville
 - .d'expérimenter des clôtures et des constructions végétales qui pourraient être reproduites ailleurs ;
 - .de jouer dans et avec la nature, différemment.

QUE RETENIR POUR LA PROCHAINE CHARTE ?


- Travailler sur l'adaptation au sol et la gestion future du site
- Travailler la relation au propriétaires de chiens
- Projet à faire connaître pour son expertise en génie végétal, et son aspect innovant et éducatif
- Développer les savoir faire en « chantiers participatifs »
- Consolider juridiquement les équipements autoconstruits sur l'espace public
- Développer cet esprit sur la nouvelle école Jean Mentelin et aux alentours

Après



Avant





Démarrage en 2015

OBJECTIFS

- Mobiliser des acteurs du PNU
- Dynamiser les 3 quartiers, faire connaître le territoire du PNU et les réalisations
- Sensibiliser à l'environnement, et au partage de savoir

BUDGET : 5 000 à 8 000 €/an, Ville de Strasbourg

DESCRIPTION DU PROJET

CONTEXTE

La réunion annuelle du PNU organisée les premières années s'est transformée en 2015 en « PNU en fête », un temps annuel mobilisant tous les acteurs volontaires sur 3 jours. Cette dynamique entre les acteurs du PNU fonctionne en parallèle des Journées du Patrimoine qui se pérennisent aussi dans ces trois quartiers.

PARTENAIRES

AREL, ASAPISTRA, ARS, ASCPA, Bretz'selle et Le Stick, Brin de Paille, CAS, Club Vosgien, CSC Camille Claus, de l'Elsau et de Montagne Verte, CREPS, Ecole Michaël, Koenigshoffen Demain, Germes d'Espoir, Foyer Saint Arbogast, Haies Vives d'Alsace, le Roethig, IMP, Jardin partagé Fridolin, La Maison du Compost, le Camping de Strasbourg, PAR Enchantement, SINE, Jardin partagé de permaculture de Saint Gall, La Maison des Jeux, Rowing Club, Velo-Station, Ecole de danse de Geipolsheim, Ville de Strasbourg...

DEROULEMENT

1. 2 ou 3 séances d'appel à projet aux partenaires avec une recherche du fil rouge de l'événement
2. La Mission PNU, S. Communication, Dir Territoire, prend en charge la communication grand public et coordonne ce qui est nécessaire

RESULTATS

Organisation de la « Fête du PNU » en 2015 – 2016 – 2017, associant une trentaine de partenaires, pour organiser sur 3 jours, avec des animations diverses, pour tous les types de publics.

FREINS OBSERVES

- Quelle durabilité dans le temps ?
- Forte incidence de la météo ...
- Manque de d'attractivité initiale de ce territoire

PARTIE EVALUATIVE

BILAN

- Bilan très positif : bons retours et désir de renouveler la fête du PNU chaque année de la part des organisateurs, des élus et des participants
- C'est un événement qui se renouvelle, les organisateurs commencent à prendre des initiatives de communication pour les événements afin de cibler leurs contacts, et s'investissent pour les futures éditions
- Cet événement est aussi une opportunité de réseau pour les acteurs du PNU : se faire connaître du public, et connaître d'autres acteurs du PNU pour créer de nouvelles collaborations
- Les organisateurs font un travail de communication à leur échelle, pour leur public en ciblant les animations appropriées

ENSEIGNEMENTS

- Les animations nautiques sont encore peu actives et les activités nautiques de 2017 ont peu fonctionné malgré un très fort potentiel ;
- Les thèmes de l'eau, des jardins, des Romains sont attractifs ;
- Les promenades découvertes fonctionnent très bien.

QUE RETENIR POUR LA PROCHAINE CHARTE ?

- Créer un événement fort d'inauguration de la fête du PNU pour mobiliser
- Penser à associer les écoles en donnant directement aux maîtresses d'écoles affiches et programmes «Fête du PNU»
- Médiatiser l'événement via des agendas culturels comme : COZÉ magazine, Strasbourg Curieux, réseaux sociaux...
- Continuer à associer de nouveaux partenaires
- Intégrer le PNU ILL RHIN...



Elyxandro CEGARRA / Pour Eurometropole



Elyxandro CEGARRA / Pour Eurometropole



Philippe Stirnweiss pour Strasbourg Eurometropole

